

水災害対策プラン進捗について(藤枝市)



1-1 下水道（雨水幹線）の整備

実施主体：藤枝市

《施策内容》

黒石川内水氾濫による浸水常襲地区への負荷軽減のため、バイパス水路整備を実施する。

■ 現在までの進捗状況


- ・全体計画L=413.9mの内、L=306.3mの整備が完了した。
(進捗率74%)

■ 施策実施に係る課題

- ・早期完成に向け、必要な予算確保に努める

■ 課題への対応方針・今後の予定

- ・令和8年度完了に向け、残延長L=107.6mの整備を行う。

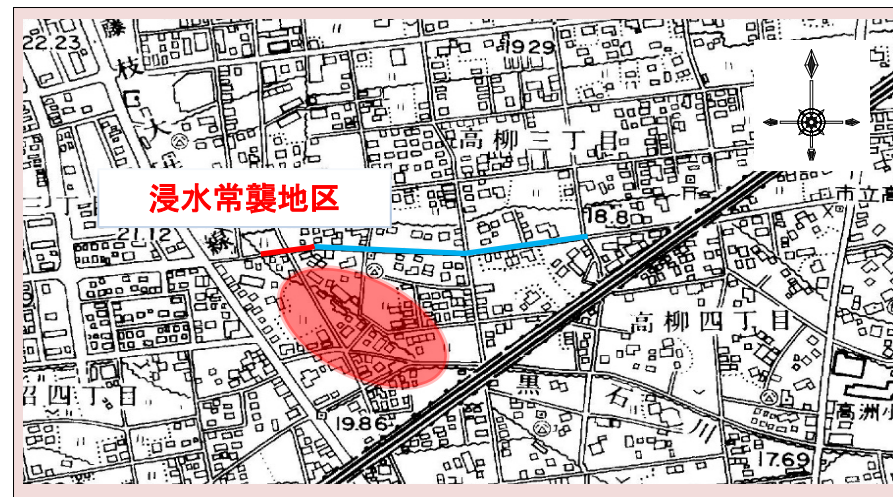

ボックスカルバート据付状況

