

交流の拡大

【事業目的】

金谷御前崎連絡道路

当事業では、この金谷御前崎連絡道路の一部区間として、国道1号菊川ICから国道473号倉沢IC間の道路新設を行っています。

【全体計画】

延長	3.3 km
事業費	20,200百万円
車線数	2車線
幅員	10m
事業期間	2012年度（平成23年度） ～2020年代前半（予定）



【お問合せ先】 静岡県島田土木事務所 工事第1課 電話：0547-37-5275

令和2年12月28日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況（工事）

- 3号橋の上部工（桁架設）の工事では桁が繋がってきており、橋の完成が見えてきました。
- 菊川地区では、4号橋（新松島橋）のA1橋台が完成しました。引き続き、農道BOXカルバートの工事を進めていきます。
- 本線土工部では、工事が進んできました。引き続き土工部を行い、跨道橋の架設工事を進めていきます。

平面図



側面図

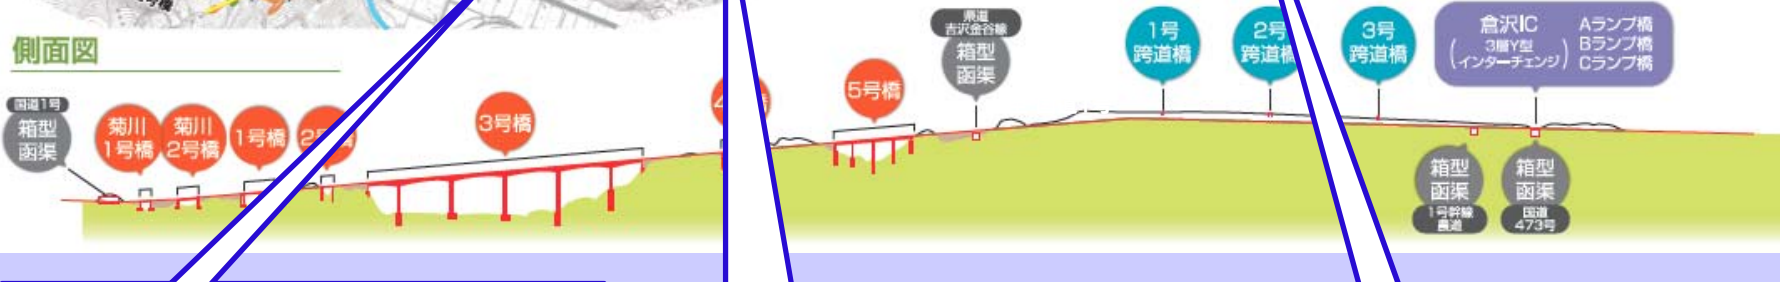

《3号橋・菊川の里大橋》



R 2.11撮影

《4号橋・新松島沢橋》



R 2.12撮影

《本線土工部》



R 2.12撮影

令和2年9月30日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)

◆現在の状況（工事）

- 3号橋の上部工（桁架設）の工事では、中央径間の2径間が閉合（結合）しました。
- 菊川地区では、3号橋（菊川の里大橋）のA2橋台が完成しました。引き続き、上部工工事を進めています。
- 本線土工部では、工事が進んでいます。引き続き、菊川ICへ向けて工事を進めています。

平面図



側面図



《3号橋・菊川の里大橋》



R2.9撮影

《3号橋・菊川の里大橋》



R2.9撮影

《本線土工部》



R2.9撮影

令和2年6月30日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況(工事)

- 菊川地区では、3号橋(菊川の里大橋)のA1橋台が完成しました。引き続き、上部工工事を進めています。
- 3号橋の上部工(桁架設)の工事を進めています。もう少しで中央部の2径間の閉合(結合)します。
- 本線土工部では、法面の掘削工事が進んでいます。菊川ICへ向けて将来の道路のラインが繋がってきています。

平面図



側面図



《3号橋・菊川の里大橋》



3号橋A1橋台工

R 2.6 撮影

《3号橋・菊川の里大橋》



R 2.6 撮影

《本線土工部》



R 2.6 撮影

令和2年3月31日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況（工事）

- 菊川地区では、3号橋（菊川の里大橋）のA1橋台の基礎工（深礎基礎）の工事を進めています。
- 3号橋の上部工（桁架設）の工事を進めています。桁の張出しが進み、今夏、中央部の2径間が閉合（結合）します。
- 4号橋～5号橋間では、法面の掘削工事が進んでいます。将来の道路のラインが見えてきました。

平面図



側面図



《3号橋・菊川の里大橋》



R2.3撮影

《3号橋・菊川の里大橋》



R2.3撮影

《4号橋～5号橋》



R2.3撮影

平成30年2月28日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況(工事)

- 菊川IC付近では、菊川2号橋の橋桁が架設されました。また、菊川1号橋A1橋台工の工事を進めています。
- 菊川地区では、3号橋のP5橋脚がまもなく完成します。また、3号橋P2橋脚及びP4橋脚の工事を進めています。
- 倉沢地区では、バイパス本線の下を交差する1号幹線農道が2月5日に開通しました。

平面図



側面図



《菊川IC》




H29.12撮影

《3号橋》



H30.2撮影

《倉沢IC》

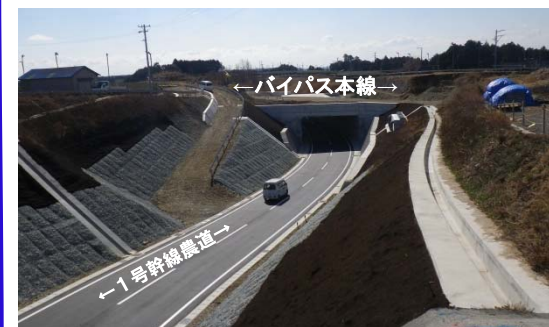

H30.2撮影

平成29年2月28日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況（工事）

- 菊川地区は、菊川1号橋、菊川2号橋の下部工事が完成しました。
- 菊川地区は、3号橋P1橋脚、P5橋脚工事が進んでいます。
- 倉沢地区では、3号跨道橋の下部工事が完成しました。1号幹線農道の付替道路工事が進んでいます。

平面図



側面図



平成28年3月1日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況(工事)

- 倉沢インターチェンジのCランプ橋は、橋桁の架設が完了しました。
- 神谷城地区では、側道工事が始まっています。

平面図



側面図



平成27年8月18日

国道473号 金谷相良道路Ⅱ 道路改良事業 (島田市菊川～菊川市倉沢)


◆現在の状況(工事)

- 菊川地区の3号橋(P3橋脚)の工事を進めています。
- 倉沢インターチェンジでは、CランプP1橋脚・BランプP1橋脚が完成しました。

平面図



側面図



3号橋P3橋脚施工状況



倉沢・神谷城地区の状況



倉沢IC
Bランプ・Cランプの状況

