

An aerial photograph of a river valley. The river flows from the top center towards the bottom. On both sides of the river, there are residential buildings, some with solar panels on their roofs, and green fields. In the background, there are rolling green hills under a cloudy sky. The text is overlaid on the image in a yellow, sans-serif font.

萩間川河川改修事業
東中橋架替

地元説明会

令和 5年 7月 25日
静岡県 島田土木事務所

前回令和4年3月の説明会后、新設橋の詳細な設計を実施してきました。

また、皆様のご協力のもと、昨年夏から用地測量、物件調査を順次進めています。

現時点での今後の事業工程、および皆様との補償交渉や移転までのスケジュール等について説明します。

萩間川改修範囲と工事進捗



・柳田川～菅ヶ谷川間の計画



事業工程表




県工事 (河川・橋梁)		令和3 年度	令和4 年度	令和5 年度	令和6 年度	令和7 年度	令和8 年度	令和9 年度	令和10 年度	令和11 年度	令和12 年度	令和13 年度
調査・設計					橋梁設計、樋管設計、用地測量、物件調査、旧橋撤去設計							
用地買収 物件補償							期間は予算や地域の意向による					
工事	東中橋					進入路 (市)	左岸 橋台	右岸 橋台	橋脚	上部工	期間は予算状況 による	
	旧橋撤去							新橋架設後、既設橋を撤去する				
	河川改修			東中橋より上流の用地買収時期は、地元の意向を尊重して進めて行く							上流側	

※今後の予算配分状況や用地交渉状況等により変更となる場合があります。

工程に関する前回説明会からの変更点

- ◆ 前は、令和7年度より橋梁部の工事着手をする予定であったが、予算の配分状況及び調査・設計の進捗状況から、工事着手時期を再検討し、令和8年度より工事着手する工程に変更しました。
- ◆ 前回説明では、左右岸の橋台工事を同時に施工することで3箇年の工事工程としていましたが、橋台工事は2箇年で工事する計画としたため、工事期間を4箇年工事としました。

設計平面図 (全体)

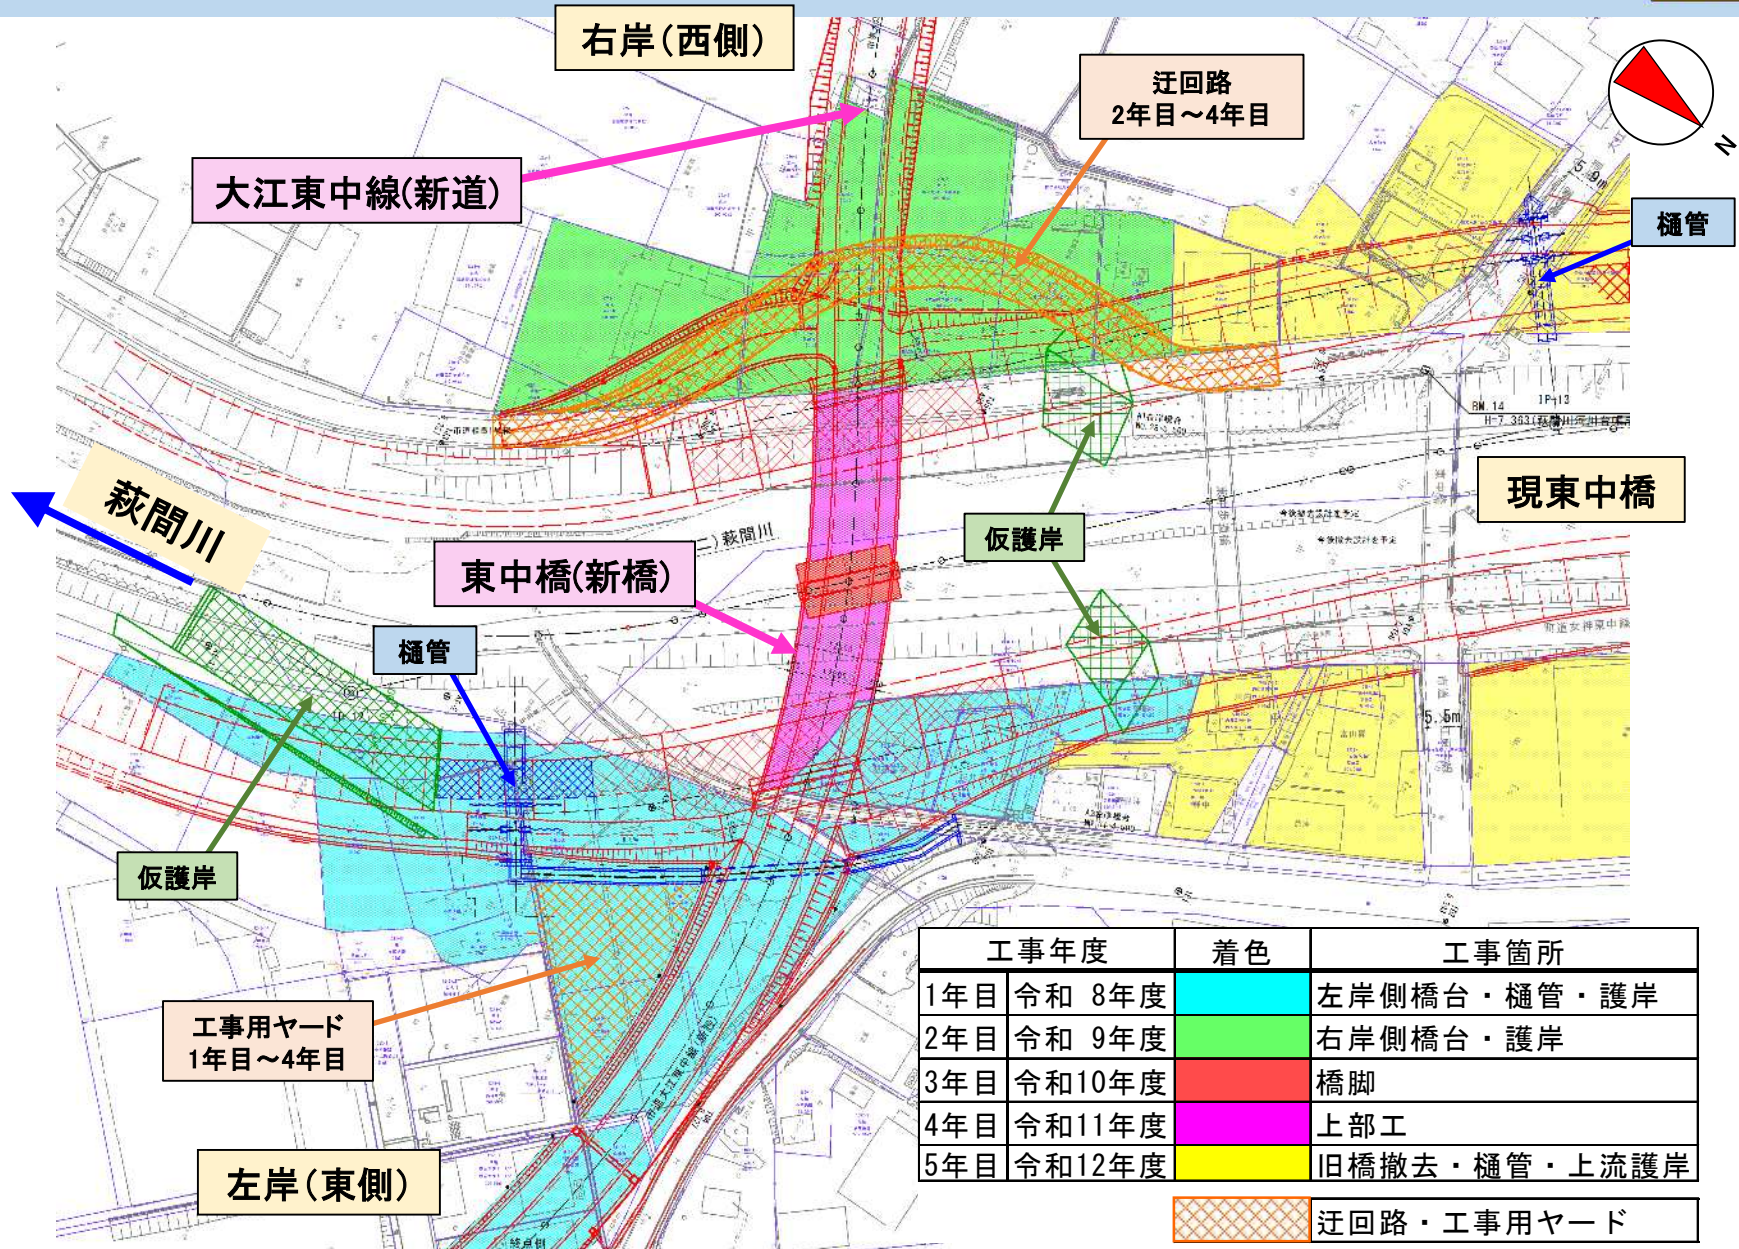


※今後の予算配分状況や用地交渉状況等により変更となる場合があります。

個別交渉に関するスケジュール(予定)



項目	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			令和13年度		
	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月
測量・調査・補償費の算定	■			■			■																				
地権者様との個別交渉				令和5年9月頃から順次着手予定																							
地権者様の交渉～住居移転期間				左岸側＝令和8年の3月まで			右岸側＝令和9年の3月まで						上流側＝令和12年の3月まで														
工事期間	左岸側							進入路(市)			令和8年の5月頃～令和9年の3月頃を予定																
	右岸側										令和9年の6月頃～令和10年の3月頃を予定																
	橋脚							令和10年の11月頃～令和11年の5月までを予定																			
	上部工										令和11年の10月頃～令和12年の5月までを予定																
	上流側													令和12年の10月頃～令和13年の5月までを予定													

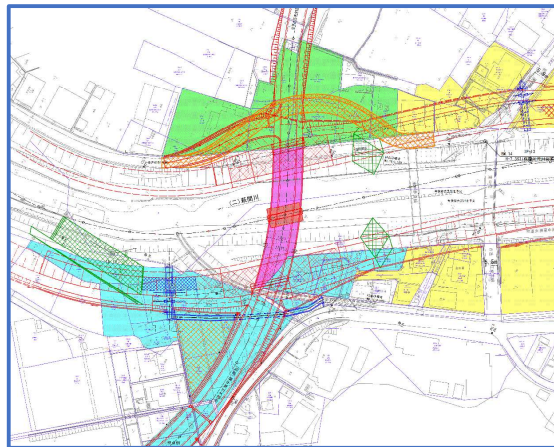

- ◆個別交渉期間等については橋梁工事に関連する地権者様を対象としたものです。
- ◆個別交渉期間等は予算状況や地域の意向により変更される可能性があります。
- ◆本表は基本的なスケジュールを示しています。個別の状況により、住居の移転期間等は本表と異なる場合があります。
